

Revisão honesta da geração e plano de execução — v1

Data: 03/10/2026 · **Projeto medido:** BioByte Sentinela v5 · **Base:** padrão de interação com agentes v1.0 (aprovado)

Tudo o que está abaixo foi medido no banco do LangNet, nos arquivos gerados e na tela — não é lembrança.


1. O que está bem

Parte	Evidência
Telas do protótipo a partir dos casos de uso	25 das 30 telas têm mockup rico, com os campos, tabelas, indicadores e botões do caso de uso e dados de exemplo plausíveis (ex.: antibiograma com rótulos de resultado por cor)
Edição pelo caso de uso	em 29/09, a edição do esquema da tela do UC-011 gerou a Especificação v2 e refez a tela (versão 2 da Interface)
Separação convencional × agêntico	31 casos de uso marcados; 5 tarefas de agente em 2 agentes (eram 45)
Rede de Petri e Bancada	a rede com as 5 tarefas roda inteira na Bancada do LangNet (29/09), com o token andando e cada tarefa com a sua saída
Decisões dos agentes	no aplicativo, multirresistência decidida pela regra certa, alerta redigido, cada decisão gravada no banco


2. O que está errado, e por quê

2.1 A tela aprovada no protótipo não chega ao aplicativo — o defeito maior

A Geração de Código **não lê os mockups** (zero usos de `mockup.html` no gerador). As telas do aplicativo saem de outros moldes, a partir da lista de componentes: uma lista de campos com "—". Quatro semanas de refino do protótipo param na etapa de Interface.

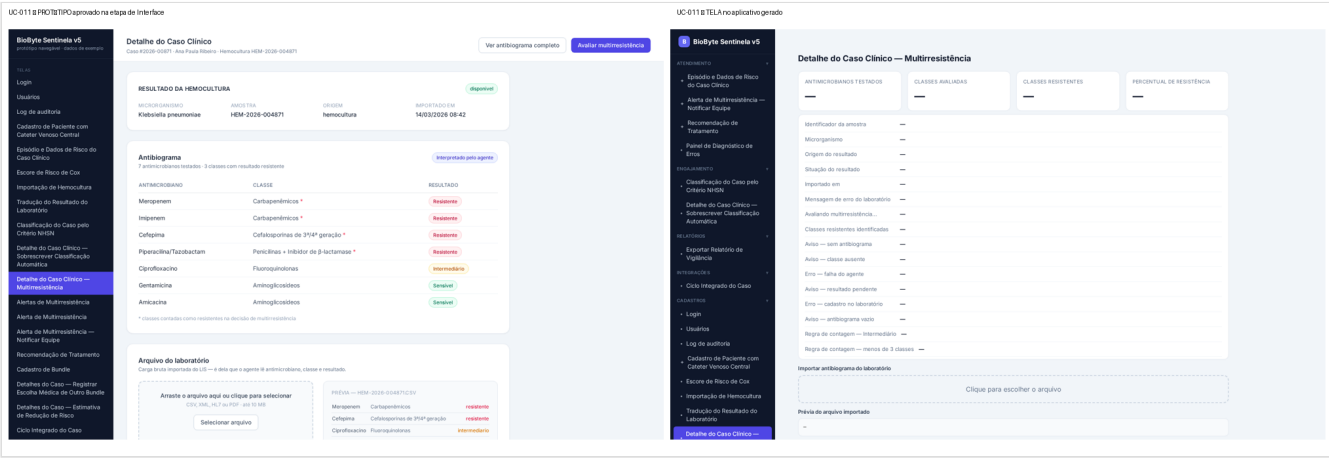

UC-011 — à esquerda, o protótipo aprovado; à direita, a tela do aplicativo gerado.

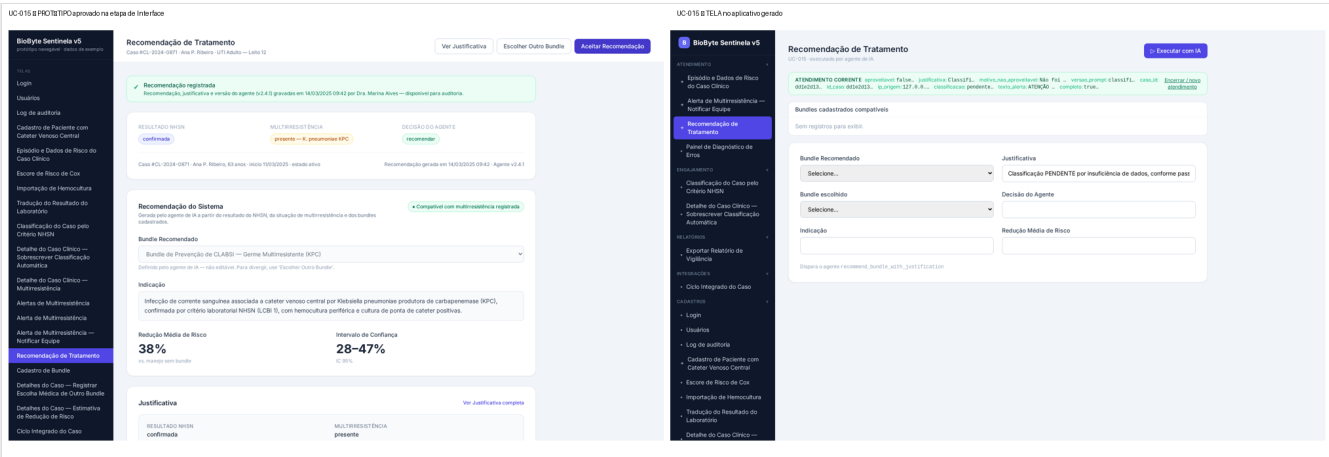

UC-015 — o mesmo descompasso na recomendação de tratamento.

2.2 As ações das telas apontam para tarefas que não existem

A etapa de Interface declarou **103 ações** do tipo "tarefa", cada uma com um nome inventado por ela (autenticar_usuario, gerenciar_alerta, identificar_multirresistencia_antibiograma...). **Nenhuma das 103** existe no `tasks.yaml` nem nos 140 adaptadores do aplicativo. As cinco telas de agente só funcionam porque a Geração de Código as religa à tarefa pelo caso de uso; as demais ficam "Ação não vinculada".

2.3 O protótipo esconde esse defeito

O protótipo é feito das páginas estáticas dos mockups: os botões não fazem nada. O provedor de dados fictício, quando usado, responde "sucesso" a **qualquer** nome de tarefa. Ninguém consegue ver, no protótipo, que uma ação não tem quem a execute — o defeito só aparece no aplicativo.

2.4 Cinco telas saíram genéricas no protótipo

UC-002 (Usuários), UC-006 (Escore de Cox), UC-012 (Alertas), UC-020 (Painel de Vigilância) e UC-031 (Segredos e Credenciais): lista com "Exemplo A/B/C", sem estilo, sem menu. A de Usuários já mostra a coluna **"SENHA HASH"** — o vazamento da senha nasce aqui.

2.5 Mensagens de exceção viraram campos

Os mockups e as telas tratam as mensagens dos fluxos de exceção ("Este e-mail já está cadastrado.", "Aviso — sem antibiograma") como **campos de exibição** com "—", em vez de mensagens que aparecem quando o caso acontece.

2.6 O refino por conversa não foi exercitado neste projeto

No BioByte v5, a Interface tem 0 mensagens de conversa: a única alteração foi pela edição no caso de uso. O caminho existe (/chat), mas não foi provado nesta versão.

2.7 Agentes, tarefas e rede

- As 5 tarefas estão todas no `clinical_classifier_agent`, inclusive a **recomendação de bundle**; o `treatment_recommender_agent` existe e não é usado.
- O **UC-025** (sinalizar hemocultura pronta e suspeita de ICSAC) é agêntico e **não virou tarefa**.
- O `tasks.yaml` carrega `traceability` e `output_schema`, fora do formato do CrewAI usado no TropicalSales.
- A rede é uma **linha reta** de 5 tarefas. A figura com dois ramos paralelos que pus na apresentação é ilustrativa — não é a rede do BioByte.
- O aplicativo gerado **não usa o framework**: o servidor de agentes é uma reimplementação de 1.047 linhas feita por molde, e o aplicativo leva um console de rede reduzido ("Admin / Petri") que não deveria estar lá.
- A classificação NHSN não recebe os critérios nem a data de início do caso → fica "pendente" e trava a cadeia.

2.8 A causa comum

Cada etapa produz bem o seu artefato, mas **a etapa seguinte não consome o que a anterior entregou**: a Geração de Código ignora o mockup; as ações da Interface não se ligam às tarefas de Agentes e Tarefas; o aplicativo ignora o framework que a Bancada testa. E eu media cada etapa isolada ("25 telas ricas", "5 tarefas", "rede roda na Bancada") sem medir o elo entre elas.

3. Plano de execução

Cada fase termina numa **prova medida** e só passa com o seu aval. Uma correção por vez; nada de regerar para descobrir; decisão de arquitetura se pergunta antes.

Fase	O que muda	Prova de aceite
F0 — Framework	o servidor de agentes do aplicativo passa a ser o framework (frameworkagentsadapterv5, orquestração por Petri), carregando o <code>agents.yaml</code> e o <code>tasks.yaml</code> intactos	a rede do BioByte roda no framework v5 com as 5 tarefas, e a Bancada do LangNet mostra a execução; se a v5 falhar, a mesma prova com a v4
F1 — Especificação	coluna "Executado por" (pronto · código gerado · agente) em cada passo dos fluxos; mensagens de exceção marcadas como mensagens	os 31 casos de uso do BioByte com a coluna preenchida; nenhuma mensagem de exceção virando campo
F2 — Interface & Protótipo	(a) cada ação aponta para o caso de uso e o passo , não para um nome inventado; (b) blocos de agente com forma (decisão · campo · tela) e posição; (c) as 5 telas genéricas viram mockup rico; (d) nada de campo sensível em tela; (e) protótipo executável que denuncia : cada botão mostra quem o executa e, se ninguém, aparece "sem executor"	30 telas ricas; 0 ações com nome inventado; no protótipo, clicar em cada ação diz quem a executa; refino por conversa provado numa tela

Fase	O que muda	Prova de aceite
F3 — Agentes, Tarefas e YAML	só passos agente viram tarefa; tarefa no agente certo; UC-025 ganha a sua tarefa; YAML no formato do CrewAI (rastreabilidade e esquema em arquivo à parte); a tarefa recebe tudo o que usa (critérios NHSN, data de início)	6 tarefas para os 6 casos de uso agênticos; recomendação no agente de tratamento; classificação deixa de ficar "pendente" por falta de entrada
F4 — Geração de Código	(a) as telas do aplicativo são as do protótipo aprovado (mesmo desenho); (b) passos pronto → moldes em rotas da API (login com token, cadastro, relatório, auditoria); (c) passos código gerado → o LLM escreve a resposta do sistema por caso de uso, como rota da API; (d) passos agente → a tarefa no framework, pelo nome; (e) Assistente único (Modo B) e marca ✦ no menu; (f) sai o console "Admin / Petri"; (g) erro nunca vira sucesso; senha nunca sai do servidor	comparação automática tela do aplicativo × protótipo aprovado, sem divergência; nenhuma ação sem executor
F5 — Portões	programa (não modelo) confere: toda ação tem executor; toda mensagem de exceção está no código; entradas/saídas da tela batem com o <code>tasks.yaml</code> ; tela do aplicativo = protótipo; resposta com erro tratada como erro	os portões reprovam um caso montado com cada defeito deste relatório, e aprovam o BioByte corrigido
F6 — Prova de ponta a ponta	regerar o BioByte pela interface do LangNet , etapa por etapa; implantar; rodar a bateria de 03/10 (31 casos de uso + 28 cadastros + cadeia de agentes); repetir num segundo projeto (Uso do Solo) para provar que é da fábrica	as 20 telas hoje sem ação respondem como o caso de uso; login funciona; cadeia clínica chega à recomendação; o segundo projeto passa na mesma bateria

Ordem e dependências: F0 e F1 podem andar juntas; F2 depende de F1; F3 depende de F1; F4 depende de F0, F2 e F3; F5 acompanha F4; F6 fecha.

O que eu me comprometo a fazer diferente: medir o **elo** entre as etapas, não só cada etapa; parar e perguntar quando a decisão for de arquitetura; não relatar uma fase como pronta sem a prova de aceite rodada.
